


瀬戸内Kirei太陽光発電所建設工事 2016年3月工事予定

赤色 予定 緑色 完了

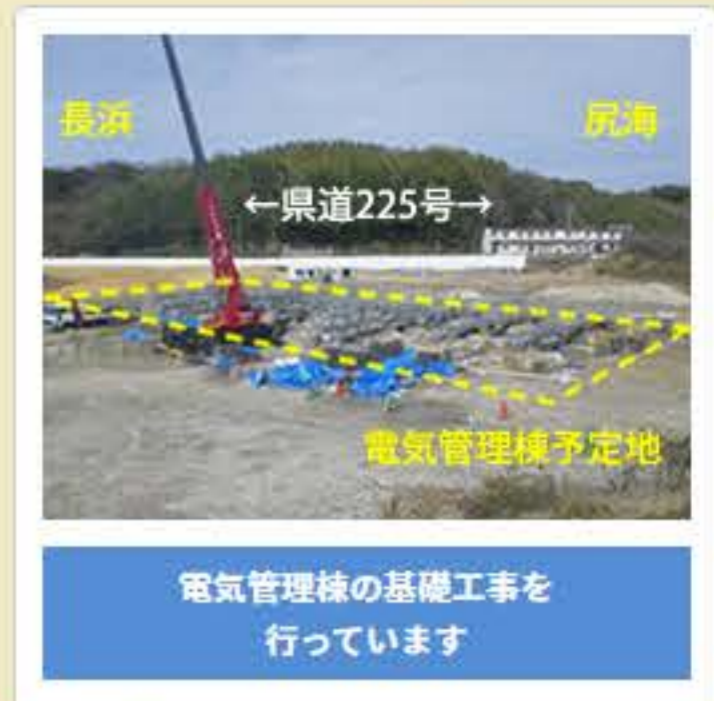

排水ポンプ場・非常用発電設備工事

堤防補強工事 8月末まで工事を中断します

太陽光パネル架台を設置します

太陽光パネル架台置き基礎を打設します

太陽光パネル架台の基礎杭を打設します

錦海ハビタット

師楽

太陽光パネル架台の組立が進んでいます



排水ポンプの安定稼働のための工事が進んでいます



新ポンプ増設



新たに増設した4台目のポンプです。



4台目のポンプからの配管を現在使用している放流管に接続する準備をしています。

ポンプ室の補修

屋根の工事をしています。



非常用発電設備

新電気室でポンプの運転管理をします。



屋根内部の開閉箇所です



4台目ポンプ操作スイッチ

電流等はデジタルで表示されます

